



Osinergmin

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

**INFORME DE AVANCE DEL
PLAN OPERATIVO 2012**

AL PRIMER TRIMESTRE

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

ABRIL – 2012

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ANTECEDENTES:	4
4. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL	5
4.1. Informe de Acción 1: Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.....	6
4.2. Informe de Acción 2: Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas .	7
4.3. Informe de Acción 3: Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas.....	8
4.4. Informe de Acción 4: Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	9
4.5. Informe de Acción 5: Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.....	10
4.6. Informe de Acción 6: Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	13

INFORME
AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2012
PRIMER TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe tiene como finalidad presentar el avance de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo, ejecutadas durante el primer trimestre del año 2012

A continuación se mencionan las acciones llevadas a cabo por la División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) para cumplir con el plan de supervisión y fiscalización de la producción, procesamiento y transporte de las actividades del gas natural del Plan Operativo, de acuerdo a las metas trazadas.

PLAN: SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL T	ANUAL	AL T	ACUM.	% Avance
1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	Informe	1	4	1	1	100%
2. Supervisión Integrada (PDJ) de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	1	100%
3. Supervisar y fiscalizar la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	1	100%
4. Supervisión pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.	Informe	1	4	1	1	100%
5. Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.	Informe	1	4	1	1	100%
6. Optimizar los procesos de supervisión de la DPTN.	Informe	0	2	0	0	0%

Como se muestran en el cuadro anterior, se ha cumplido con las 5 metas propuestas para este primer trimestre. Complementariamente, en el presente informe se muestran las necesidades comprendidas en cada una de las 6 acciones, incluyendo las contrataciones y las visitas de supervisión.

2. INTRODUCCIÓN

La División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) es la encargada de gestionar las acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente en materia técnica y de seguridad de las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.

3. ANTECEDENTES:

La DPTN tiene aprobado el siguiente plan y sus respectivas acciones en el Plan Operativo de 2012:

PLAN	ACCIÓN
Supervisar la producción, procesamiento y transporte de gas natural	1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.
	2. Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas
	3. Supervisar y Fiscalizar la Gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas.
	4. Supervisión Pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.
	5. Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.
	6. Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

En la presente sección se detallan las acciones y las necesidades respectivas ejecutadas por la DPTN para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural.

Además, como resultado general de la supervisión presentamos los siguientes indicadores:

Programa general de Actividades de Supervisión de la DPTN

Durante el primer trimestre del año 2012, se ha cumplido con el 72,12% de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas, esto debido principalmente a las reprogramaciones de los proyectos del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur) y Loop Sur (TGP). En el Anexo 4, se muestran los detalles de visitas de supervisión por áreas de la DPTN y globales, y en los numerales 4.4 y 4.5 se detallan las acciones de supervisión pre operativas (del diseño y construcción) de los proyectos de producción procesamiento y transporte de gas natural.

Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Natural

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continuo, para que se realice la posterior distribución.

ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA FÓRMULA	INDICADOR ANUAL SEGÚN CONTRATO BOOT ¹	RESULTADO 1er. TRIM	RESULTADO ACUMULADO
Nº de horas disponibles / Nº de horas del año	8696/ 8784	(1)	(1)

(1) Durante el primer trimestre del 2012, no hay evidencia de paros no programados y/o fallas que hayan afectado la disponibilidad del sistema de transporte.

¹ **Numeral 5.8 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate. Disponibilidad del sistema de Transporte de Gas:** El sistema de transporte de gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo. (...).

4.1. Informe de Acción 1:

Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.

PLAN / ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL I T	ANUAL	AL I T	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisar la calidad del Servicio de Producción y Transporte del Gas Natural	Informes	1	4	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidades N°19141 y 19144

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del año 2012, se han realizado 16 visitas de supervisión para verificar el aspecto técnica social y atender las denuncias realizadas, y así asegurar la calidad del servicio en la Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural, superando la meta programada de 13 visitas.

Supervisión de la calidad del servicio de producción, procesamiento y transporte de gas natural.		
N° de Visitas DPTN - (Al Primer trimestre 2012)		
Trimestre	Aspecto Técnico Social y Denuncias	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	16	13
Total	16	13

El incremento de la cantidad de visitas ejecutadas durante este periodo se debió a un incidente en el ducto de líquidos de gas natural, ocurrido el 22 de febrero en las inmediaciones del Derecho de Vía del Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa, a la altura del Kp 91+150, en la zona de Manugali, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco.

Las estadísticas de supervisión de la calidad del servicio en la producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

4.2. Informe de Acción 2:

Supervisión integrada (PDJ) de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas

PLAN / ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL I T	ANUAL	AL I T	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informes	1	4	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro anterior. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

Necesidades Nº19146, 19148 y 19151
Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del año 2012, se han realizado 25 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad de las instalaciones supervisadas, estas visitas incluyen las visitas realizadas a partir de la verificación de los formatos de Declaraciones Juradas presentadas por cada empresa, superando la meta programada de 22 visitas.

En la siguiente tabla se presentan las visitas ejecutadas y programadas para el primer trimestre:

Supervisión Integrada (PDJ) de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas.		
N° de Visitas DPTN - (Al Primer trimestre 2012)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	25	22
Total	25	22

Las estadísticas de Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

4.3. Informe de Acción 3:

Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IT	ANUAL	AL IT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisar y Fiscalizar la gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas	Informes	1	4	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 19155:

Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión en general de las Actividades de Gas Natural.

Mediante Acta N° TFHA-01-2011, OSINERGMIN acordó con la Empresa de Transportes Felipe J. Huanca Alvérez E.I.R.L, ganadora de la buena pro, iniciar el servicio el 16 de abril de 2012, fecha estimada en la cual iniciarán las labores de Supervisión al Proyecto Loop Sur, proyecto por el cual se contrató el servicio.

Necesidades N° 19157 y 19158

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del 2012, se han realizado 9 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad; y así asegurar la gestión de la integridad de ductos de las empresas supervisadas, la meta programada fue de 32 visitas.

En la siguiente tabla se presenta el resumen del trimestre:

Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas		
N° de Visitas (Al Primer trimestre 2012)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	9	32
Total	9	32

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el primer trimestre del 2012, destinadas a la supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas, ha sido menor al número de visitas programadas, debido a que los supervisores fueron reasignados a visitas especiales para supervisar la falla en el ducto de Aguaytía.

Cabe mencionar que añadido a este incidente está el hecho de que algunas empresas todavía no se sujetan al sistema de gestión de integridad por encontrarse en el proceso de adecuación de acuerdo a su cronograma de ejecución.

Las estadísticas de Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

4.4. Informe de Acción 4:

Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IT	ANUAL	AL IT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N°19164

Contratación del Servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur

Cabe mencionar que los términos de referencia que se elaboraron para cubrir la necesidad de Evaluación de la Geotécnica del Loop Sur también incluyen el servicio de evaluación de la geotécnica de las instalaciones de los Sistemas de Recolección de la Locación Mipaya, Lote 56 y de la Locación Kinteroni, Lote 57.

Durante el primer trimestre del 2012, se realizó el proceso de Selección para la Contratación de este Servicio. Con fecha 27 de marzo se realizó la evaluación de las propuestas técnicas de los postores, y se espera el otorgamiento de la Buena Pro, para la primera semana del mes de abril. Ver el calendario de actividades en el Anexo 1.

Necesidad N°19168

Contratación del Servicio de Inspección de Soldadura en la Fase Constructiva Loop Sur

Al igual que la necesidad anterior, los términos de referencia que se elaboraron para cubrir la necesidad de Inspección de Soldadura en la fase Constructiva del Loop Sur también incluyen el servicio de Inspección de Soldadura en la fase Constructiva de las instalaciones de los Sistemas de Recolección de la Locación Mipaya, Lote 56 y de la Locación Kinteroni, Lote 57.

Durante el primer trimestre del 2012, se llevo a cabo el proceso de Selección para la Contratación de este Servicio. El otorgamiento de la Buena Pro está programado para el 02 de abril de 2012. Ver el calendario de actividades en el Anexo 1.

Necesidad N°20192

Servicio de Investigación del Incidente de Falla del Ducto de 10 Pulgadas de diámetro del Sistema de Transporte de Gas Natural de la Empresa Aguaytía.

Con fecha 03 de febrero de 2012, inició el contrato entre OSINERGMIN y Gas Azul Energy Systems Inc, para la Investigación del Incidente de Falla del Ducto de 10 Pulgadas de diámetro del Sistema de Transporte de Gas Natural de la Empresa Aguaytía. Este contrato culminó con la presentación del entregable cuyo cargo de entrega se muestra en el Anexo 1, con fecha 19 de marzo de 2012.

Necesidad N°19160, 19161 y 19163

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del año 2012 se han realizado 25 visitas de supervisión Pre - Operativas para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad. Dentro de estas visitas se incluyen los proyectos de Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Malvinas, el Proyecto de Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco, el Proyecto de instalación de una cuarta bomba en cada estación de bombeo del Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural, los Proyectos de Construcción de Sistemas de Recolección en la Locación Mipaya, Lote 56 y en la Locación Kinteroni, Lote 57 y los Proyectos de Desarrollo de los Lotes 56 y 57.

En la siguiente tabla se resume la cantidad de visitas de supervisión realizadas durante este trimestre:

Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural		
N° de Visitas DPTN - (Al Primer trimestre 2012)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero - Marzo	25	37
Total	25	37

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el primer trimestre del 2012, destinadas a la supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural, ha sido menor al número de visitas programadas, debido a las reprogramaciones de los proyectos del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur) y Loop Sur.

Las estadísticas de Supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

4.5. Informe de Acción 5:

Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IT	ANUAL	AL IT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.	Informes	1	4	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N°19171:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de separación Malvinas.

Con fecha 15 de enero de 2012 se publicaron las Bases y Términos de Referencia para el Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel A N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Gas Natural – Malvinas.

Las propuestas técnicas presentadas fueron evaluadas, y con fecha 15 de febrero, la convocatoria fue declarada desierta, puesto que la empresa participante no cumplía con los requisitos mínimos.

Las Bases y los Términos de Referencia fueron revisadas por el Comité encargado y con fecha 28 de febrero se publicó la Segunda Convocatoria del Proceso de Selección. Con fecha 22 de marzo, la convocatoria fue declarada desierta, puesto que la empresa participante no cumplía con los requisitos mínimos. En el Anexo 2 se muestran imágenes de las dos convocatorias realizadas.

A fines del primer trimestre, las Bases y los Términos de Referencia, están siendo revisados por el Comité a cargo para publicar la Tercera Convocatoria del Proceso de Selección.

Necesidad N°19172:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco

Con fecha 15 de enero de 2012 se publicaron las Bases y Términos de Referencia para el Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel A N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pisco.

Las propuestas técnicas presentadas fueron evaluadas, y con fecha 15 de febrero, la convocatoria fue declarada desierta, puesto que el postor no cumplía con los requisitos mínimos.

Las Bases y los Términos de Referencia fueron revisadas por el Comité encargado y con fecha 28 de febrero se publicó la Segunda Convocatoria del Proceso de Selección. Con fecha 22 de marzo, la convocatoria fue declarada desierta, puesto que la empresa participante no cumplía con los requisitos mínimos. En el Anexo 2 se muestran imágenes de las dos convocatorias realizadas.

A fines del primer trimestre, las Bases y los Términos de Referencia, están siendo revisados por el Comité a cargo para publicar la Tercera Convocatoria del Proceso de Selección.

Necesidad N°19173:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la ampliación del sistema de transporte de Camisea al City Gate

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a que acorde a la información proporcionada por la Empresa TGP, las actividades de construcción del Loop Sur estarían empezando en el mes de abril.

4.6. Informe de Acción 6:

Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IT	ANUAL	AL IT	ACUM.	% Avance
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL						
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	0	2	0	0	0%

Acorde con el cronograma de cumplimiento de las metas del Plan Operativo, no se contempla como meta reportar el avance de esta actividad al Primer Trimestre. Sin embargo, cabe mencionar que la acción para optimizar los procesos de supervisión de la DPTN, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 19175:

Contratación de Consultoría para la optimización de la gestión por procesos BPM de la supervisión de la DPTN.

Durante el Primer Trimestre de 2012 en coordinación con el área de Sistemas de la GFGN y de OSINERGMIN, se trabaja en la elaboración de las Bases y Términos de Referencia, para llevar a cabo esta contratación.

Necesidad N° 19177:

Contratación de Consultoría para la Implementación de la Gestión Estandarizada de Proyectos y Portafolio de Proyectos de la DPTN

Durante el Primer Trimestre de 2012 se han elaborado en coordinación con el área de Sistemas de la GFGN y de OSINERGMIN, las Bases y Términos de Referencia para llevar a cabo esta contratación.

Necesidad N° 20293:

Contratación de Consultoría para la Evaluación de la Gestión de la Supervisión de la DPTN

Esta consultoría inicio servicios en el 2011, y acorde con lo definido en la Cuarta Adenda del Contrato de Locación de Servicios N°021-2011, la empresa BCTS Consulting presentó con fechas 13 de enero y 13 de febrero el Sexto y Séptimo Informe de Servicio, respectivamente.

Estos Informes fueron revisados por el equipo encargado, y se verificó que cumplían con los porcentajes de avance correspondientes.

Con fecha 13 de marzo de 2012, se firmó la Quinta Adenda del Contrato, donde se extendió la presentación del Informe Final (Octavo Informe), inicialmente programado para el 13 de marzo, hasta el 30 de marzo de 2012, esto con el fin de lograr la implementación óptima de los tres (03) Procesos To BE seleccionados por la GFGN y sus procesos precedentes.

Efectivamente con fecha 30 de marzo de 2012, BCTS presentó el Octavo Informe correspondiente al periodo 14 de febrero al 30 de marzo de 2012, este informe se encuentra en revisión por parte de la DPTN.

En el Anexo 3, se muestra más información correspondiente a esta necesidad.

ANEXOS

ANEXO 1

Informe de Acción 4:

Necesidad Nº19164

Contratación del Servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

DATOS DEL PAIC:
 Dem : 193
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR
 Monto Ref. PAIC : \$/450,000.00
 Mes de Convocatoria : FEBRERO
 Area Solicitante : GERENCIA FISC. GAS NATURAL

DATOS DEL REQUERIMIENTO:
 Ira Convocatoria : 18 Numero : 4
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR
 Monto Subterfido : \$/450,750.00
 Archivos: [CONDICIONES](#), [CONDICIONES](#), [CONTENIDO DE EVALUACION](#)

Orden	Responsable de Aprobación	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Kneil Grassbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	20/01/2012	20/01/2012
2	Fred Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	20/01/2012	20/01/2012
3	Varela Cuervo, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	20/01/2012	20/01/2012
4	Spino Cabero, Mardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	20/01/2012	20/01/2012
5	Rodriguez Inca, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	20/01/2012	20/01/2012
6	Salvador Jasme, Julia	APRUEBA REQUERIMIENTO	20/01/2012	23/01/2012

[Ver Total de Aprobaciones](#)

DATOS DEL PROCESO:
 Ira Convocatoria : 18
 Nombre : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR
 Tipo : CP-CONCURSO PUBLICO
 Numero : CP-0004-2012-OSINERGMIN
 Nº de Convocatoria : 1
 Cronograma

Orden	Descripción Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Culminado
1	RECEPCION DE REQUERIMIENTO	23/01/2012	24/01/2012	SI
2	RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITE ESPECIAL	26/01/2012	26/01/2012	SI
3	RECEPCION DE RESOLUCION POR COMITE ESPECIAL	27/01/2012	27/01/2012	SI
4	PONER BASES Y DISPOSICION DE COMITE ESPECIAL (AREA USUARIA)	20/01/2012	30/01/2012	SI
5	BASES LISTA PARA ELEVAR PARA APROBACION	30/01/2012	30/01/2012	SI
6	BASES APROBADAS	08/02/2012	08/02/2012	SI
7	CONVOCAATORIA	08/02/2012	08/02/2012	SI
8	REQUERITO DE PARTICIPANTES	09/02/2012	16/02/2012	SI
9	PRESENTACION DE CONSULTAS	09/02/2012	17/02/2012	SI
10	RESOLUCION DE CONSULTAS	24/02/2012	24/02/2012	SI
11	PRESENTACION DE OBSERVACIONES	27/02/2012	02/03/2012	SI
12	RESOLUCION DE OBSERVACIONES	09/03/2012	09/03/2012	SI
13	INTEGRACION DE BASES	15/03/2012	15/03/2012	SI
14	PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA	26/03/2012	26/03/2012	SI
15	EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA	27/03/2012	03/04/2012	SI
16	PRESENTACION Y EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA	03/04/2012	03/04/2012	SI
17	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	03/04/2012	03/04/2012	SI
18	CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	18/04/2012	18/04/2012	NO
19	SUSCRIPCION DE CONTRATO	31/03/2012	10/04/2012	NO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Vista de la Lista de Actividades para el Proceso de Contratación del Servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur

Informe de Acción 4:

Necesidad N°19168

Contratación del Servicio de Inspección de Soldadura en la Fase Constructiva Loop Sur

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

DATOS DEL PAAC:
 Item : 04
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR
 Monto Ref. PAAC : \$/430.000.00
 Mes de Convocatoria : FEBRERO
 Área Solicitante : GERENCIA FISC. GAS NATURAL

DATOS DEL REQUERIMIENTO:
Ira Convocatoria
 Serie : 18 Numero : 3
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR
 Monto Sustentado : \$/407.270.00
 Archivos: [CARACTERISTICAS](#)
 [CONDICIONES](#)
 [CRITERIOS-DE-EVALUACION](#)

Orden	Responsable de Aprobacion	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Grieszbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	20/01/2012	20/01/2012
2	Field Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	20/01/2012	20/01/2012
3	Vasquez Guerra, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	20/01/2012	20/01/2012
4	Espiritu Cabello, Martin	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	20/01/2012	20/01/2012
5	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	20/01/2012	20/01/2012
6	Salvador Jacome, Julio	APRUEBA REQUERIMIENTO	20/01/2012	23/01/2012

[Ver Total de Aprobaciones](#)

DATOS DEL PROCESO:
Ira Convocatoria
 Nombre : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR
 Tipo : CP-CONCURSO PUBLICO
 Numero : CP-0005-2012-OSINERGMIN
 N° de Convocatoria : 1
 Cronograma

Orden	Descripción Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Culminado
1	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO	23/01/2012	23/01/2012	SI
2	RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ ESPECIAL	26/01/2012	26/01/2012	SI
3	RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN POR COMITÉ ESPECIAL	26/01/2012	26/01/2012	SI
4	PONER BASES A DISPOSICIÓN DE COMITÉ ESPECIAL (ÁREA USUARIA)	30/01/2012	30/01/2012	SI
5	BASES LISTA PARA ELEVAR PARA APROBACIÓN	06/02/2012	06/02/2012	SI
6	BASES APROBADAS	08/02/2012	08/02/2012	SI
7	CONVOCATORIA	08/02/2012	08/02/2012	SI
8	REGISTRO DE PARTICIPANTES	09/02/2012	16/03/2012	SI
9	PRESENTACIÓN DE CONSULTAS	09/02/2012	17/02/2012	SI
10	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	24/02/2012	24/02/2012	SI
11	PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES	27/02/2012	02/03/2012	SI
12	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	09/03/2012	09/03/2012	SI
13	INTEGRACIÓN DE BASES	15/03/2012	15/03/2012	SI
14	PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA	23/03/2012	23/03/2012	SI
15	EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA	26/03/2012	30/03/2012	SI
16	PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA	23/03/2012	30/03/2012	SI
17	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	02/04/2012	02/04/2012	SI
18	CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	16/04/2012	16/04/2012	NO
19	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	30/04/2012	30/04/2012	NO

Vista de la Lista de Actividades para el Proceso de Contratación del Servicio de Inspección de Soldadura en la Fase Constructiva Loop Sur

Necesidad N°20192

Servicio de Investigación del Incidente de Falla del Ducto de 10 Pulgadas de diámetro del Sistema de Transporte de Gas Natural de la Empresa Aguaytía.

	Fecha : 03/04/2012	Hora : 5:05 PM	
CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS			
Número de Expediente	20120049968	Fecha de Ingreso 03/04/2012	Hora 5:05 PM
Tipo de Documento	CARTA		
Número de Documento	SN		
Oficina de Destino	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL		
Proceso	GFGN-Documents Varios		
Remitente	GASAZUL ENERGY SYSTEMS INC. - SUCURSAL DEL PERU		
Dirección	RODOLFO RUTTE 658 - -		
Asunto	REMITE: INFORME FINAL SERVICIO SEGUN CLS 019-2012		
Observación	CONSTA DE 02 ARCHIVADORES+ 01 CD.		
Nota	Para un próximo trámite, recuerde señalar el número de expediente 20120049968		
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Bernardo Montegudo 222 - Magdalena del Mar Tel: 2193400			
BDE JO			

Vista del cargo de Documentos Ingresados del último entregable

	
<p>Servicio de Investigación del Incidente en KP 36 + 928 Gasoducto de 10" de la Estación Neshuya a la Central Térmica de Aguaytía</p>	
<p>Contrato OSINERGMIN N° 019-2012</p>	
<p>Informe Final N° 12-04-03GG01</p>	
<p>Presentado a</p>	
	

Vista del último entregable de Gas Azul

ANEXO 2

Informe de Acción 5:

Necesidad Nº19171:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de separación Malvinas.

PRIMERA CONVOCATORIA

Publicación de la convocatoria en la Página web de Osinergmin

ACTIVIDADES		FECHAS
Publicación de Convocatoria y Bases		15 de enero de 2012
Presentación de Consultas y aclaraciones		Hasta el 23 de enero de 2012
Absolución de consultas y aclaraciones		25 de enero de 2012
Presentación de Confirmación de Participación, para lo cual deberá utilizar el formato Anexo 01.3 CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN		Hasta el 27 de enero de 2012
Publicación de lista de postulantes		30 de enero de 2012
Presentación de Propuesta Técnica y Propuesta Económica (Acto Público)		03 de febrero de 2012
Comunicación de resultados de evaluación de Propuesta Técnica- Apertura y evaluación de Propuesta Económica, de ser el caso y Presentación de Resultados Finales (Acto Público)		07 de febrero de 2012
Plazo de presentación de solicitud de reconsideración		07 de febrero de 2012
Respuesta a solicitud de reconsideración		08 de febrero de 2012

Calendario del Proceso

Términos de Referencia – Planta Malvinas

SEGUNDA CONVOCATORIA

The screenshot shows the Osinergmin website interface. The main heading is "Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel 'A' - N° 01 - 2012 OSINERGMIN-GFGN - SEGUNDA CONVOCATORIA". Below this, there is a list of steps in the process, each with a status icon (a red 'X' or a blue checkmark):

- 1. Bases Proceso de Selección Empresa Supervisoras Nivel A (Status: X)
- 2. Anexo 01.1 TR Certificación del Comisionado Ampliación Malvinas (Status: X)
- 3. Anexo 01.2 TR Certificación del Comisionado Ampliación Pisco (Status: X)
- 4. Anexo 01.2.1 Matriz Casca Eléctrico Planta Pisco (Status: X)
- 5. Anexo 01.2.2 Sistema Mecánico de Seguridad Planta Pisco (Status: X)
- 6. Anexo 01.3 Confirmación de Participación (Status: Checkmark)
- 7. Anexo 01.4 Experiencia de la Empresa Supervisoras (Status: Checkmark)

Publicación de la convocatoria en la Página web de OSINERGMIN

The screenshot shows the "Bases del Proceso de Selección" page. It includes a calendar of activities and definitions.

1.3. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES	FECHAS
Publicación de Convocatoria y Bases	28 de febrero de 2012
Presentación de Consultas y aclaraciones	Hasta el 02 de marzo de 2012
Absolución de consultas y aclaraciones	06 de marzo de 2012
Presentación de Confirmación de Participación, para lo cual deberá utilizarse el formato Anexo 01.3 CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN	Hasta el 06 de marzo de 2012
Publicación de lista de postulantes	06 de marzo de 2012
Presentación de Propuesta Técnica y Propuesta Económica (Acto Público)	15 de marzo de 2012
Comunicación de resultados de evaluación de Propuesta Técnica-Apertura / evaluación de Propuesta Económica, de ser el caso y Presentación de Resultados Finales (Acto Público)	20 de marzo de 2012
Plazo de presentación de solicitud de reconsideración	21 de marzo de 2012
Respuesta a solicitud de reconsideración	22 de marzo de 2012

1.4. DEFINICIONES

Para los efectos de este Proceso de Selección, y en concordancia con el Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras, aprobado por Resolución N° 205-2009-OS/CD (en adelante, Reglamento) se definen los siguientes términos:

1.4.1. CERTIFICACIÓN.- Confirmación de ciertas características de construcción de un proyecto. La certificación es otorgada en virtud a un informe previo de evaluación, el cual se sustenta a su vez en una labor de supervisión.

Calendario del Proceso

The cover page features the Osinergmin logo and the following text:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL "A"

N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN-Segunda Convocatoria

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

ANEXO 01.1

TERMINOS DE REFERENCIA

FEBRERO 2012

Lima - Perú

Términos de Referencia – Planta Malvinas

The content page features the Osinergmin logo and the following text:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE EMPRESAS SUPERVISORAS DE NIVEL "A"

CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL "A" PARA CERTIFICAR EL COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE GAS NATURAL - MALVINAS

1. OBJETIVO

Certificar el Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Gas Natural - Malvinas.

2. ANTECEDENTES

De conformidad con su Ley de Creación, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y demás normas complementarias, OSINERGMIN posee facultades para supervisar y fiscalizar a las entidades del sector energía velando, entre otros, por el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas por parte de las entidades supervisadas.

El Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 035-2003-EM, establece las normas y disposiciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Refinerías y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos, que incluye las plantas de procesamiento de gas natural.

El Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 036-2003-EM, establece las normas y disposiciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de tanques de almacenamiento en cualquiera de las diferentes etapas de la industria de los hidrocarburos.

Necesidad N°19172:

Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco

PRIMERA CONVOCATORIA



Publicación de la convocatoria en la Página web de OSINERGMIN



BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN

Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel "A"
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

1.3. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES	FECHAS
Publicación de Convocatoria y Bases	15 de enero de 2012
Presentación de Consultas y aclaraciones	Hasta el 23 de enero de 2012
Absolución de consultas y aclaraciones	25 de enero de 2012
Presentación de Confirmación de Participación, para lo cual deberá utilizar el formato Anexo 01.3 CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN	Hasta el 27 de enero de 2012
Publicación de lista de postulantes	30 de enero de 2012
Presentación de Propuesta Técnica y Propuesta Económica (Acto Público)	03 de febrero de 2012
Comunicación de resultados de evaluación de Propuesta Técnica- Apertura / evaluación de Propuesta Económica, de ser el caso y Presentación de Resultados Finales (Acto Público)	07 de febrero de 2012
Plazo de presentación de solicitud de reconsideración	07 de febrero de 2012
Respuesta a solicitud de reconsideración	08 de febrero de 2012

Calendario del Proceso

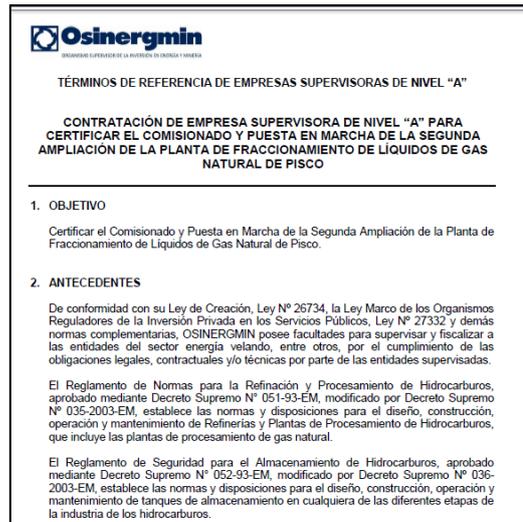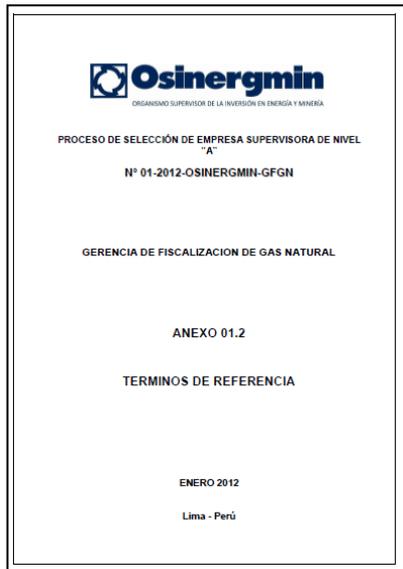

Términos de Referencia – Planta Pisco

SEGUNDA CONVOCATORIA

The screenshot shows the Osinergmin website interface. The main content area displays the title 'Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel "A" - N° 01 - 2012 OSINERGMIN-GFGN - SEGUNDA CONVOCATORIA'. Below the title, there is a list of items with status indicators (red 'X' or blue checkmarks):

- Respuesta a Solicitud de Reconsideración [X]
- Resultado de Evaluación de Propuesta Técnica [X]
- Listo de Postulantes [X]
- Absolución de Consultas y Aclaraciones [X]
- 1. Bases Proceso de Selección Empresa Supervisoras Nivel A [X]
- 2. Anexo 01.1 TR Certificación del Comisionado Ampliación Matvina [X]
- 3. Anexo 01.2 TR Certificación del Comisionado Ampliación Pisco [X]
- 4. Anexo 01.2.1 Matriz Causa Efecto Planta Pisco [X]
- 5. Anexo 01.2.2 Sistema Mecánico de Seguridad Planta Pisco [X]
- 6. Anexo 01.3 Confirmación de Participación [X]
- 7. Anexo 01.4 Experiencia de la Empresa Supervisoras [X]

Publicación de la convocatoria en la Página web de OSINERGMIN

The document shows the 'BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN' for 'Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel "A"'. The 'CALENDARIO DEL PROCESO' section includes the following table:

ACTIVIDADES	FECHAS
Publicación de Convocatoria y Bases	28 de febrero de 2012
Presentación de Consultas y aclaraciones	Hasta el 02 de marzo de 2012
Absolución de consultas y aclaraciones	05 de marzo de 2012
Presentación de Confirmación de Participación, para lo cual deberá utilizar el formato Anexo 01.3 CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN	Hasta el 05 de marzo de 2012
Publicación de lista de postulantes	06 de marzo de 2012
Presentación de Propuesta Técnica y Propuesta Económica (Acto Público)	15 de marzo de 2012
Comunicación de resultados de evaluación de Propuesta Técnica- Apertura / realización de Propuesta Económica, de ser el caso y Presentación de Resultados Finales (Acto Público)	20 de marzo de 2012
Plazo de presentación de solicitud de reconsideración	21 de marzo de 2012
Respuesta a solicitud de reconsideración	22 de marzo de 2012

Below the calendar, there are 'DEFINICIONES' and a specific definition for 'CERTIFICACIÓN'.

Calendario del Proceso

The cover page features the Osinergmin logo and the following text:

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL "A"

N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN-Segunda Convocatoria

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

ANEXO 01.2

TERMINOS DE REFERENCIA

FEBRERO 2012

Lima - Perú

Términos de Referencia – Planta Pisco

The content page includes the following sections:

TERMINOS DE REFERENCIA DE EMPRESAS SUPERVISORAS DE NIVEL "A"

CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE NIVEL "A" PARA CERTIFICAR EL COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL DE PISCO

1. OBJETIVO

Certificar el Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pisco.

2. ANTECEDENTES

De conformidad con su Ley de Creación, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y demás normas complementarias, OSINERGMIN posee facultades para supervisar y fiscalizar a las entidades del sector energía velando, entre otros, por el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y/o técnicas por parte de las entidades supervisadas.

El Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 035-2003-EM, establece las normas y disposiciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Refinerías y Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos, que incluye las plantas de procesamiento de gas natural.

El Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-93-EM, modificado por Decreto Supremo N° 035-2003-EM, establece las normas y disposiciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de tanques de almacenamiento en cualquiera de las diferentes etapas de la industria de los hidrocarburos.

ANEXO 3

Informe de Acción 6:

Necesidad N° 20293:

Contratación de Consultoría para la Evaluación de la Gestión de la Supervisión de la DPTN

 <p>OSINERGMIN ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</p>
<p style="text-align: center;">ADDENDA</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 021-2011</p> <p>Conste por el presente documento la Addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011, que celebran de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN, con R.U.C. N° 20376082114, con domicilio en jirón Bernardo Monteagudo N° 222, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente de Administración y Finanzas, Sra. Victoria del Pilar Pajares Sayán, identificada con DNI N° 07886489 y su Gerente de Fiscalización de Gas Natural, Sr. Leoncio Julio Salvador Jácome, identificado con DNI N° 31627223, designados mediante Resolución de Gerencia General OSINERGMIN N° 446-2011-OS/GG, de fecha 28 de octubre de 2011, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" y de la otra parte la empresa BCTS CONSULTING S.A., con RUC N° 20508082119, con domicilio legal para efectos de la presente addenda en Av. Paz Soldán N° 170, interior N° 903, distrito de San Isidro, provincia de Lima y departamento de Lima, cuyos representantes son el Sr. Sergio Luis Francisco Meneses Vidal, identificado con D.N.I. N° 09375531 y la Sra. Patricia Blanca Nuñez Paico, identificada con D.N.I. N° 07960840, según poder inscrito en el Asiento N° A00001, de la Partida N° 11601910 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:</p> <p>PRIMERO: ANTECEDENTES:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Con fecha veintiocho (28) de abril de 2011, se suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 entre "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", como consecuencia de la Buena Pro otorgada a este último en el proceso de selección Concurso Público N° 0002-2011-OSINERGMIN, para la "Contratación de consultoría para la evaluación de la gestión de la supervisión de la división de producción, procesamiento y transporte", por un monto total ascendente a S/. 398,273.40 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Tres con 40/100 Nuevos Soles) y por el plazo de 150 días calendario contados desde el día hábil siguiente de la firma del acta de inicio de actividades.b) Con fecha veintisiete (27) de mayo de 2011 se suscribió el acta de inicio de actividades, siendo la fecha de inicio de la prestación el treinta (30) de mayo de 2011.c) Mediante addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 de fecha veintiséis (26) de agosto de 2011, se modificó la cláusula cuarta y quinta del mencionado contrato, ampliándose por tanto el plazo de la prestación hasta el diez (10) de noviembre de 2011.d) Mediante addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 de fecha diez (10) de noviembre de 2011, se modificó la cláusula cuarta y quinta del mencionado contrato, ampliándose por tanto el plazo de la prestación hasta el treinta (30) de noviembre de 2011.e) Mediante addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 de fecha treinta (30) de noviembre de 2011, se modificó la cláusula cuarta y quinta del
<p style="text-align: right;">1</p>



mencionado contrato, ampliándose por tanto el plazo de la prestación hasta el catorce (14) de diciembre de 2011.

- f) Mediante addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 de fecha catorce (14) de diciembre de 2011, se incorporó las cláusulas vigésimo primera, vigésimo segunda, vigésimo tercera y vigésimo cuarta ampliándose por tanto el plazo de la prestación adicional hasta el trece (13) de marzo de 2012, asimismo modificó de cláusula cuarta del mencionado contrato.
- g) Mediante Requerimiento de addenda de fecha trece (13) de marzo de 2012, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de "LA ENTIDAD", adjuntó el Acta N° BCTS-16-2012, donde ambas partes consideraron que para lograr la implementación óptima de los tres (03) Procesos TO BE seleccionados por dicha gerencia y sus procesos precedentes, se requiere ampliar el plazo máximo de las prestaciones del servicio en diecisiete (17) días calendario y en consecuencia prorrogar el plazo de entrega del Octavo Informe. Dicha gerencia indica que cuenta con la conformidad del contratista.
- h) De conformidad con el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, procede la ampliación del plazo contractual, entre otros, por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

SEGUNDO: De conformidad con lo señalado en la cláusula precedente, las partes acuerdan mediante la presente addenda modificar las cláusulas cuarta y vigésimo tercera del Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011:

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

"LA ENTIDAD" se obliga a pagar la contraprestación a "EL CONTRATISTA" en ocho (08) armadas, según el siguiente detalle:

Entregable	Fecha	Monto
Primer Entregable	28/06/2011	S/. 119,482.02
Segundo Entregable	01/08/2011	S/. 69,697.85
Tercer Entregable	12/09/2011	S/. 69,697.85
Cuarto Entregable	11/10/2011	S/. 69,697.85
Quinto Entregable	14/12/2011	S/. 69,697.83
Sexto Entregable	13/01/2012	S/. 17,666.66
Sétimo Entregable	13/02/2012	S/. 17,666.66
Octavo Entregable	30/03/2012	S/. 17,666.68

Respecto al sexto, séptimo y octavo informe, estos deberán contener el avance de hasta el cuarenta por ciento (40%), ochenta por ciento (80%) y cien por ciento (100%), respectivamente, del avance de la implementación



de los procesos precedentes y de la optimización de la implementación de los tres procesos seleccionados.

Los pagos se efectuarán luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en las Bases, debiendo contar con la conformidad de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de "LA ENTIDAD", de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser ésta recibida.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL

La vigencia del servicio referido a la contratación adicional se extenderá desde el quince (15) de diciembre de 2011 hasta el treinta (30) de marzo de 2012, teniendo en cuenta que la vigencia del presente contrato se da hasta la conformidad de la recepción de la última prestación pactada a cargo de "EL CONTRATISTA" y el pago respectivo.


TERCERO: Las partes se ratifican en el contenido de todas las demás cláusulas contenidas en el Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011.


Firmado por las partes en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los trece (13) días del mes de marzo de 2012, en dos (2) ejemplares de idéntico tenor para constancia de las partes.




Victoria del Pilar Pajares Sayan
Gerente de Administración y Finanzas
"LA ENTIDAD"


Leoncio Julio Salvador Jácome
Gerente de Fiscalización de Gas Natural
"LA ENTIDAD"




Sergio Luis Francisco Meneses Vidal
Representante
"EL CONTRATISTA"


Patricia Blanca Nuñez Paico
Representante
"EL CONTRATISTA"



ANEXO 4

VISITAS DE SUPERVISIÓN CLASIFICADAS POR ASPECTO A SUPERVISAR

Tabla N°1 – Visitas Programadas realizadas durante el Primer Trimestre 2012

MES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	PP	T	PP	T	PP	T
Supervisar la Calidad del Servicio	0	5	0	3	0	5
Supervisión Integrada	9	0	8	0	5	0
Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integridad de Ductos	0	13	0	11	0	8
Supervisión Pre Operativa	3	9	4	6	5	10
SUBTOTAL	12	27	12	20	10	23
TOTAL	39		32		33	

PP: Producción y Procesamiento de Gas Natural
T: Transporte de Gas Natural

Tabla N°2 – Visitas Ejecutadas realizadas durante el Primer Trimestre 2012

MES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	PP	T	PP	T	PP	T
Supervisar la Calidad del Servicio	0	7	0	3	0	6
Supervisión Integrada	9	2	6	1	7	0
Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integridad de Ductos	0	1	0	4	0	4
Supervisión Pre Operativa	3	3	4	7	2	6
SUBTOTAL	12	13	10	15	9	16
TOTAL	25		25		25	

PP: Producción y Procesamiento de Gas Natural
T: Transporte de Gas Natural

Tabla N°3 – Visitas Mensuales Ejecutadas y Programadas según Áreas de la DPTN.

MES	PRODUCCION Y PROCESAMIENTO		TRANSPORTE	
	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas
ENE	12	12	13	27
FEB	10	12	15	20
MAR	9	10	16	23
TOTAL	31	34	44	70

GRAFICO N°1 – Cumplimiento del Programa de Supervisión Mensual

